


開成町新庁舎建設工事
令和元年11月 完成予定

【進捗状況 No. 2】

令和元年8月6日現在

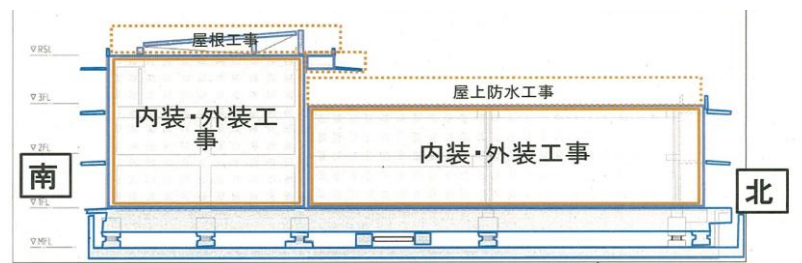

【作業状況】

内装・外装工事（朱色）を施工しています。

躯体等（青色）は施工完了しました。

◇屋上防水工事

◇各階の内装工事

現在、屋上のアスファルト防水を実施しています。同時に各階では、天井内の配管・配線や間仕切り壁などの内装工事が行われています。



【屋上防水工事】

屋上アスファルト防水後、断熱材（50mm）を敷設し、その上に押えコンクリートを打設しました。四角い鉄筋は、ソーラーパネルを乗せる基礎となります。



【あじさいパネル（木重ね格子）設置工事】


町民プラザの2階部分の窓には日射を遮蔽し、筋違の役割も果たしているあじさいパネルが設置されました。材料はカラマツ集成材（北海道等、東北産）で寸法は4寸角ダブルとなっており、1枚当たり450kgです。山形県の会社で製作されました。



令和元年8月6日撮影

《内装工事・設備工事》

現在、各階の内装工事及び設備工事が進められています。

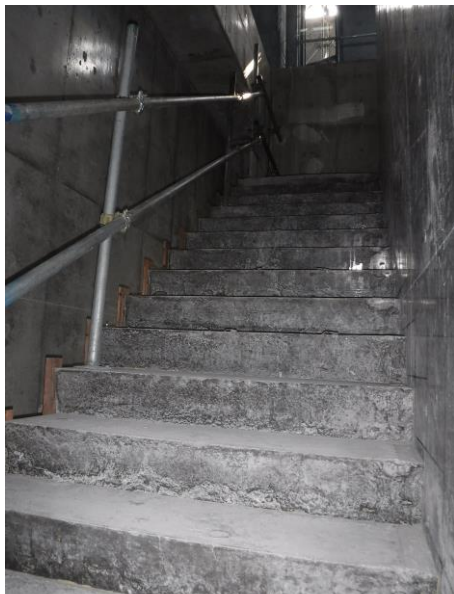

【階段部】（写真：階段）

階段は、鉄筋コンクリートで作られており、GL工法で仕上げていきます。
西側階段 A は耐摩耗性、耐久性を強化した WPC フローリング、東側階段 B はタイルカーペットで床を仕上げていきます。



【エレベーター設置】

エレベーターの設置が始まりました。



【天井内の配管工事】（写真：1F 通路）

天井内には、電気配線ラックや空調の配管など様々な配管が設置されています。



【吸音断熱材】（写真：3F 機械室）

1F, 3F 機械室壁には、グラスルールの吸音断熱材が設置されています。



【受変電設備設置工事】

新庁舎及び町民センターの電気を供給するための受電設備と変電設備が設置されました。
