


開成町新庁舎建設工事
令和元年11月 完成予定

【進捗状況】

令和元年7月24日現在

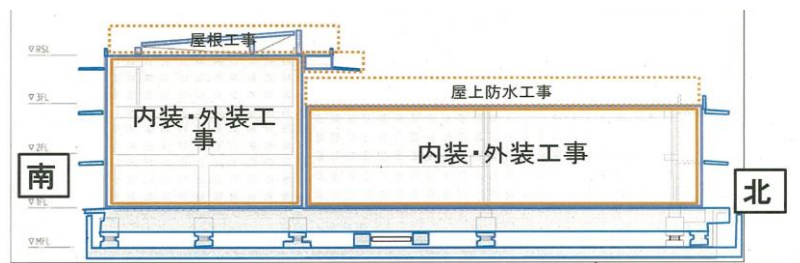

【作業状況】

内装・外装工事（朱色）を施工しています。

躯体等（青色）は施工完了しました。

◇屋上防水工事

◇各階の内装工事

現在、屋上のアスファルト防水を粉っています。同時に各階では、天井内の配管・配線や間仕切り壁などの内装工事が行われています。



【屋上防水工事】

建物を雨漏りから防ぐために、建物の中に水が入り込まないようにする仕組みです。
今回は、においを抑えるためゴムアスファルト系塗膜防水工法を採用しました。
この上に押えコンクリートを打設します。



【免震階の様子】

免震階は、設備配管、電気配管工事が行われています。
写真は、空調用ダクトが配管されています。



令和元年7月22日撮影

《内装工事・設備工事》

現在、各階の内装工事及び設備工事が進められています。



【間仕切り壁】(写真：3F 通路)

間仕切り壁は、軽量鉄骨で壁の下地を組み、両側から石膏ボードを貼り付けます。
部屋の用途によって、断熱性、耐火性、遮音性などの優れた壁に仕上げていきます。
ボードを張る前に、壁の中に、照明のスイッチやコンセントボックスが設置されます。



【脱衣・シャワー室】

2階には、ユニットシャワーが設置されています。




【天井内の配管工事】(写真：1F 通路)

天井内には、電気配線ラックや空調の配管など様々な配管が設置されています。



【断熱材】(写真：3F 議員ロビー)

外壁に面した壁には、断熱の吹付が行われています。

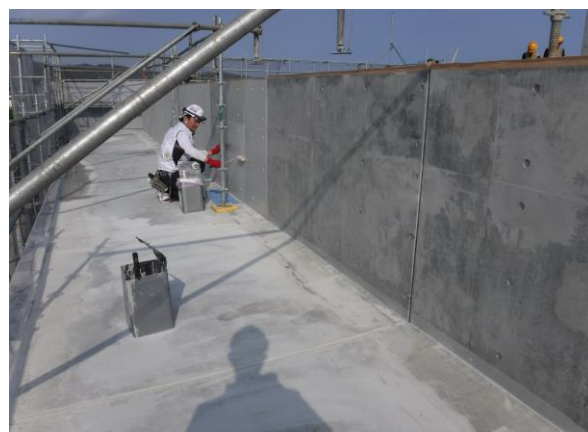

【外壁塗装】(写真：3F 底部)

塗膜を形成し雨水等の進入による劣化・中性化から保護し、コンクリートの長寿命化をはかります。
